

8月 計画/実績表

計 画	リサイクル率 95%以上
-----	--------------

実 績	リサイクル率 96.01%
-----	---------------


マテリアルリサイクル	68.77%
------------	--------

サーマルリカバリー	27.24%
-----------	--------

エミッション	3.99%
--------	-------

品目別搬入実績

※埋設系廃棄物数量: 82.5m³ (0.47%)

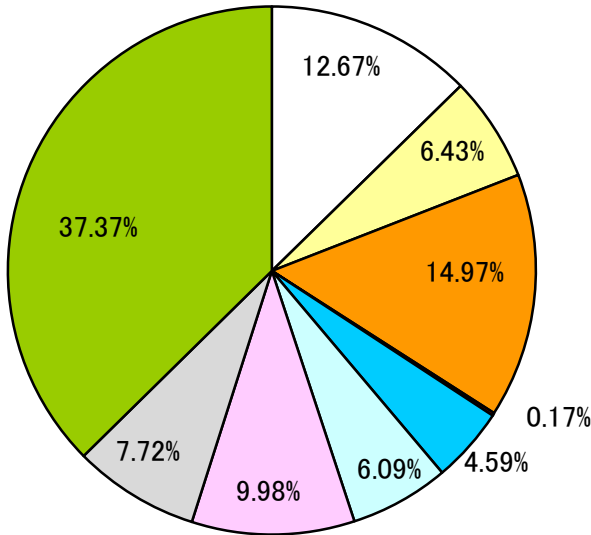

廃プラ	2,009.59
紙くず	765.25
木くず	1,482.08
繊維くず	0.00
金属くず	1,334.71
ガラス陶磁器	452.46
石膏ボード	48.84
がれき類	332.77
内訳数量	6,425.70

品目	受入数量
廃プラ	2,179.20
紙くず	1,105.70
木くず	2,574.50
繊維くず	29.00
金属くず	789.90
ガラス陶磁器	1,047.58
石膏ボード	1,716.90
がれき類	1,327.00
混合廃棄物	6,425.70
搬入数量	17,195.48

選別・圧縮率 40.19 %

選別・圧縮量 6,910.88 m³


品目別搬出実績

※埋設系廃棄物前月残数量: 0m³

※埋設系廃棄物数量 82.5m³ (0.79%)

アワノ総合開発 70.0m³
太平洋セメント 10.0m³

大青工業 2.5m³

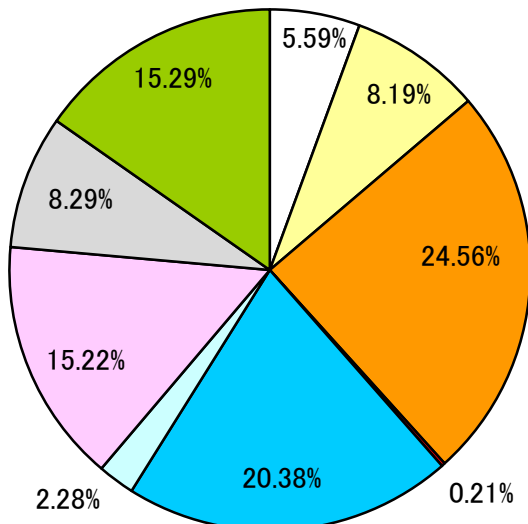

廃プラ	616.32
紙くず	132.27
木くず	161.80
繊維くず	13.58
金属くず	78.86
ガラス陶磁器	369.72
石膏ボード	9.00
がれき類	190.95
内訳数量	1,572.50

品目	搬出数量
廃プラ	575.00
紙くず	842.00
木くず	2,525.80
繊維くず	21.30
金属くず	2,096.00
ガラス陶磁器	234.00
石膏ボード	1,565.00
がれき類	853.00
混合廃棄物	1,572.50
搬出数量	10,284.60

品目別仕様先別搬出実績


東明興業株式会社

大品目	中品目	仕様先	M. T. E (m³)			品目別搬出 数量 (m³)	構成比
			マテリアル	サーマル	エミッション		
廃 プ ラ	0600 再生不可	リファイン	69.00				
	0600 再生可能	北越コーポレーション					
		エコロ					
		不二柱商事	302.00				
		豊栄化学	64.00				
		和円商事					
		和円クリーン・エチコ					
		トクヤマ					
		ナコード(太平洋セメント)		65.00			
		大青工業					
0600		矢島礦業所					
		埼玉県環境			75.00	575.00	5.59%
ずく紙	0710 再生不可	金子商事	842.00				
0700	0711 再生可能	須賀				842.00	8.19%
木 く ず	0810 再生不可	新エネ		300.00			
	0810 再生可能	ハイオマス群馬					
	0811 生木、伐根	三菱トレーディング		75.00			
		北進重機					
		東京ボード					
		エフバイオス		500.00			
		木材開発		1,544.80			
		レンゴーペーパー		106.00		2,525.80	24.56%
0800							
く織 ず維	0910 繊維くず	三島谷興産					
0900		大洋土づくり	21.30			21.30	0.21%
		都築					
く金 ず属	1210 再生可能	真下商店	318.00				
1200	1220 再生不可	リバー	1,632.00				
		丸二商店	146.00			2,096.00	20.38%
陶ガ 磁ラ 器ス	1310 ガラスくず	UBE三菱	78.00				
	1320 陶磁器くず	埼玉県環境			78.00		
		二光産業処理					
		太平洋セメント					
		TREガラス					
		矢島礦業所			78.00	234.00	2.28%
1300							
ボ石 ー ド膏	1322 石膏ボード(未使用端材)	ナコード	56.00				
	1322 石膏ボード(クロス付)	ギプロ	1,173.00				
	1322 石膏ボード(岩綿吸音板付)	エコフロンティア					
	1322 石膏ボード(水濡れ等)	トクヤマチヨダジブサム	336.00				
	1322 珪素含有	仙台環境					
1300						1,565.00	15.22%
きが 類れ	1500 がれき類	日本舗材	96.00				
	1500 コンクリートがら	アワノ総合	757.00				
	1502 アスファルト・コンクリートがら	日本道路					
		矢島礦業所					
		北関東環境				853.00	8.29%
1500							
混 合 廃 棄 物	2021 新築系廃棄物	北関東環境	160.00				
		大青工業			259.50		
	2022 改修・解体系廃棄物	太平洋セメント	235.00				
		リーテム					
	3600 複合材	リバー	78.60		183.40		
		トクヤマ					
		ツネイシカムテクス		17.10	1.90		
		J&T臨海		69.00			
		オリックス資源		47.00			
		仙台環境			10.00		
		三島谷興産	288.00				
		レックス					
		アクトリー					
		神鋼産業					
		ミダック(浜名湖)					
		ミダック(遠州)					
		ミダック(奥山の杜)					
		大瀧商店	223.00				
		エコルジャパン					
		苫小牧					
2010 2020 3600						1,572.50	15.29%
合 計			6,874.90 (66.85%)	2,723.90 (26.49%)	685.80 (6.67%)	10,284.60	100.00%

8月度 副産物(選別・売買)実績表

実績搬入数量	17,277.98m3	実績搬出数量	10,284.60m3
マテリアルリサイクル	6,875m3	サーマルリカバリー	2,724m3
		エミッション	686m3

品目別副産物売買搬入実績

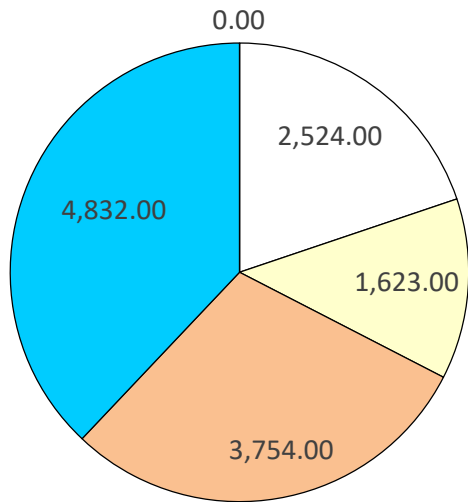

品 目		副産物		計(m³)
		単品(m³)	混合(m³)	
	廃プラ	1,295.00	1,229.00	2,524.00
	紙くず	1,220.00	403.00	1,623.00
	木くず	2,640.00	1,114.00	3,754.00
	繊維くず			0.00
	金属くず	792.00	4,040.00	4,832.00
	ガラス陶磁器			0.00
	石膏ボード			0.00
	がれき類			0.00
	混合廃棄物			0.00
総数量		5,947.00	6,786.00	12,733.00

副産物数量	12,733.00m3	選別・圧縮率	54.21%	売買数量	5,830.80m3
-------	-------------	--------	--------	------	------------

品目別売買搬出実績

大品目	中品目	仕様先	M. T (m³)		品目別搬出数量 (m³)	構成比
			マテリアル	サーマル		
廃プラ 0600	0600 再生可能	北越コーポレーション		0.00	367.00	6.29%
		エコロ	0.00			
		不二桂商事	302.00			
		和円商事	0.00			
		トクヤマ		0.00		
		ナコート(太平洋セメント)		65.00		
紙くず 0700	0711 再生可能	金子商事	842.00		842.00	14.44%
		須賀	0.00			
木くず 0800	0810 再生可能	新エネ		300.00	2,525.80	43.32%
		バイオマス群馬		0.00		
		三菱トレーディング		75.00		
		東京ボード	0.00	0.00		
		エフバイオス		500.00		
		木材開発		1,544.80		
		レンゴ-ペーパー		106.00		
金属くず 0900	1210 再生可能	真下商店	318.00		2,096.00	35.95%
		リバー	1,632.00			
		丸二商店	146.00			
ガラ陶 1300	1310 ガラスくず	TREガラス	0.00		0.00	0.00%
売 買 数 量			3,240.00	2,590.80	5,830.80	100.00%

環境SDGs(廃棄物の適正処理、3Rの推進、化学物質の削減)

【令和7年8月度】

収 集 運 搬 (直 送)

東明興業株式会社

品 目	名 称	再生・広域・中間	数量(m³)	合計数量	備考
廃プラ	再生可能・再生不可			0.00	
紙くず	再生可能・再生不可			0.00	
金属くず	再生可能・再生不可			0.00	
ガラス 陶磁器	石膏ボード(未使用端材)	吉野石膏	86.00	86.00	
	石膏ボード(岩綿吸音板付)	ギプロ			
		チヨダウーテ			
	石膏ボード(珪素含有)	仙台環境			
		ミダック			
		ギプロ			
がれき類	アスファルト・コンクリートがら	砂町アスコン		0.00	
		日本舗材			
混合廃棄物	改修・解体系廃棄物	仙台環境		0.00	
	家電	ナガオ			
石綿含有	ガラ陶(スレート、ケイカル板、石綿吸音版等)	二光産業	23.80	66.80	
		ミダック			
		仙台環境			
	廃プラ(Pタイル、長尺シート等)	二光産業	43.00		
		仙台環境			
	がれき類(セメント円筒、セメント管等)	二光産業			
		仙台環境			
水銀使用製品	蛍光灯・水銀灯	ウム・ヴェルト・ジャパン		0.00	
合 計			152.80	152.80	

収 集 運 搬 (積 替 保 管)

品 目	名 称	再生・広域・中間	数量(m³)	合計数量	備考
ガラス陶磁器	石膏ボード(珪素含有)	仙台環境	36.70	36.70	
石綿含有	ガラ陶(スレート、ケイカル板、石綿吸音版等)	二光産業	17.60	61.20	
		仙台環境	43.60		
	廃プラ(Pタイル、長尺シート等)	二光産業	10.70	15.20	
		仙台環境	4.50		
	がれき類(セメント円筒、セメント管等)	二光産業		1.10	
		仙台環境	1.10		
水銀使用製品	蛍光灯・水銀灯	ウム・ヴェルト・ジャパン	5.20	5.20	
合 計			119.40	119.40	

選 別 返 却

品 目	名 称	返却先	件数	数量(m³)	合計数量	備考
ガラス陶磁器	石膏ボード(珪素含有)	新築			2.00	
		改修	1	2.000		
		解体				
石綿含有	ガラ陶(スレート、ケイカル板、石綿吸音版等)	新築	5	12.500	13.64	
	廃プラ(Pタイル、長尺シート等)	改修	3	1.12		
	がれき類(セメント円筒、セメント管等)	解体	1	0.02		
水銀使用製品	蛍光灯・水銀灯	新築			0.230	
		改修	2	0.210		
		解体	1	0.020		
フロン	エアコン 冷凍冷蔵機器	新築			0.00	
		改修				
		解体				
その他 許可品目外	残灰	新築	3	0.50	6.72	
	クリンカー	改修	3	3.02		
	家電製品 他	解体	3	3.20		
合 計			22	22.59	22.59	

環境SDGs(廃棄物の適正処理、化学物質の削減)

【R7年8月度】

石綿含有他返却一覧表

東明興業株式会社

搬入日	受注No.	工事種類	品目・品名	数量(m ³)	返却日	受注No.
8/4	40299129	改修	油圧ホース(油入り)	1.00	8/18	40300369
8/4	40299672	新築	粉体	0.20	8/21	40300384
8/6	40299721	改修	OYボード	2.00	8/9	40300817
8/13	40301096	改修	AS木付スレート(管理型)	0.02	8/15	40301261
8/19	40301312	改修	粉体	2.00	8/20	40301757
8/21	40301850	新築	AS木付スレート(管理型)	0.10	9/2	40303526
8/22	40301997	新築	廃塗料(受入不可)	0.10	8/25	40302336
8/22	40300170	改修	ガスボンベ	0.02	8/25	40302443
8/25	40302155	新築	ASスレート混入がれき	2.50	8/26	40302163
8/25	40302156	新築	ASスレート混入がれき	2.50	8/26	40302166
8/25	40302154	新築	ASスレート混入がれき	2.50	8/26	40302167
8/25	40302153	新築	ASスレート混入がれき	2.50	8/26	40302164
8/25	40302157	新築	ASスレート混入がれき	2.50	8/26	40302165
8/25	40302038	新築	ASTミジ管(安定型)	0.02	8/28	40302813
8/25	40302295	解体	燃え殻	3.00	9/17	40305559
8/28	40303103	解体	粉体	0.20	8/29	40303307
8/30	40301318	新築	ASスレート混入ボード(管理型)	1.00	9/6	40303640
				22.16		

環境SDGs(3Rの推進、化学物質の削減)

【R7年8月度】

水銀使用製品返却一覧表

東明興業株式会社

[illegible]

環境SDGs（廃棄物の適正処理、化学物質の削減）

【R7年8月度】

家電製品返却一覧表

東明興業株式会社

[illegible]

環境SDGs（廃棄物の適正処理、化学物質の削減）


【R7年8月】

一次電池返却一覽表

東明興業株式会社

[illegible]

産業廃棄物の一連の処理行程
2025年8月度（稼働25日）

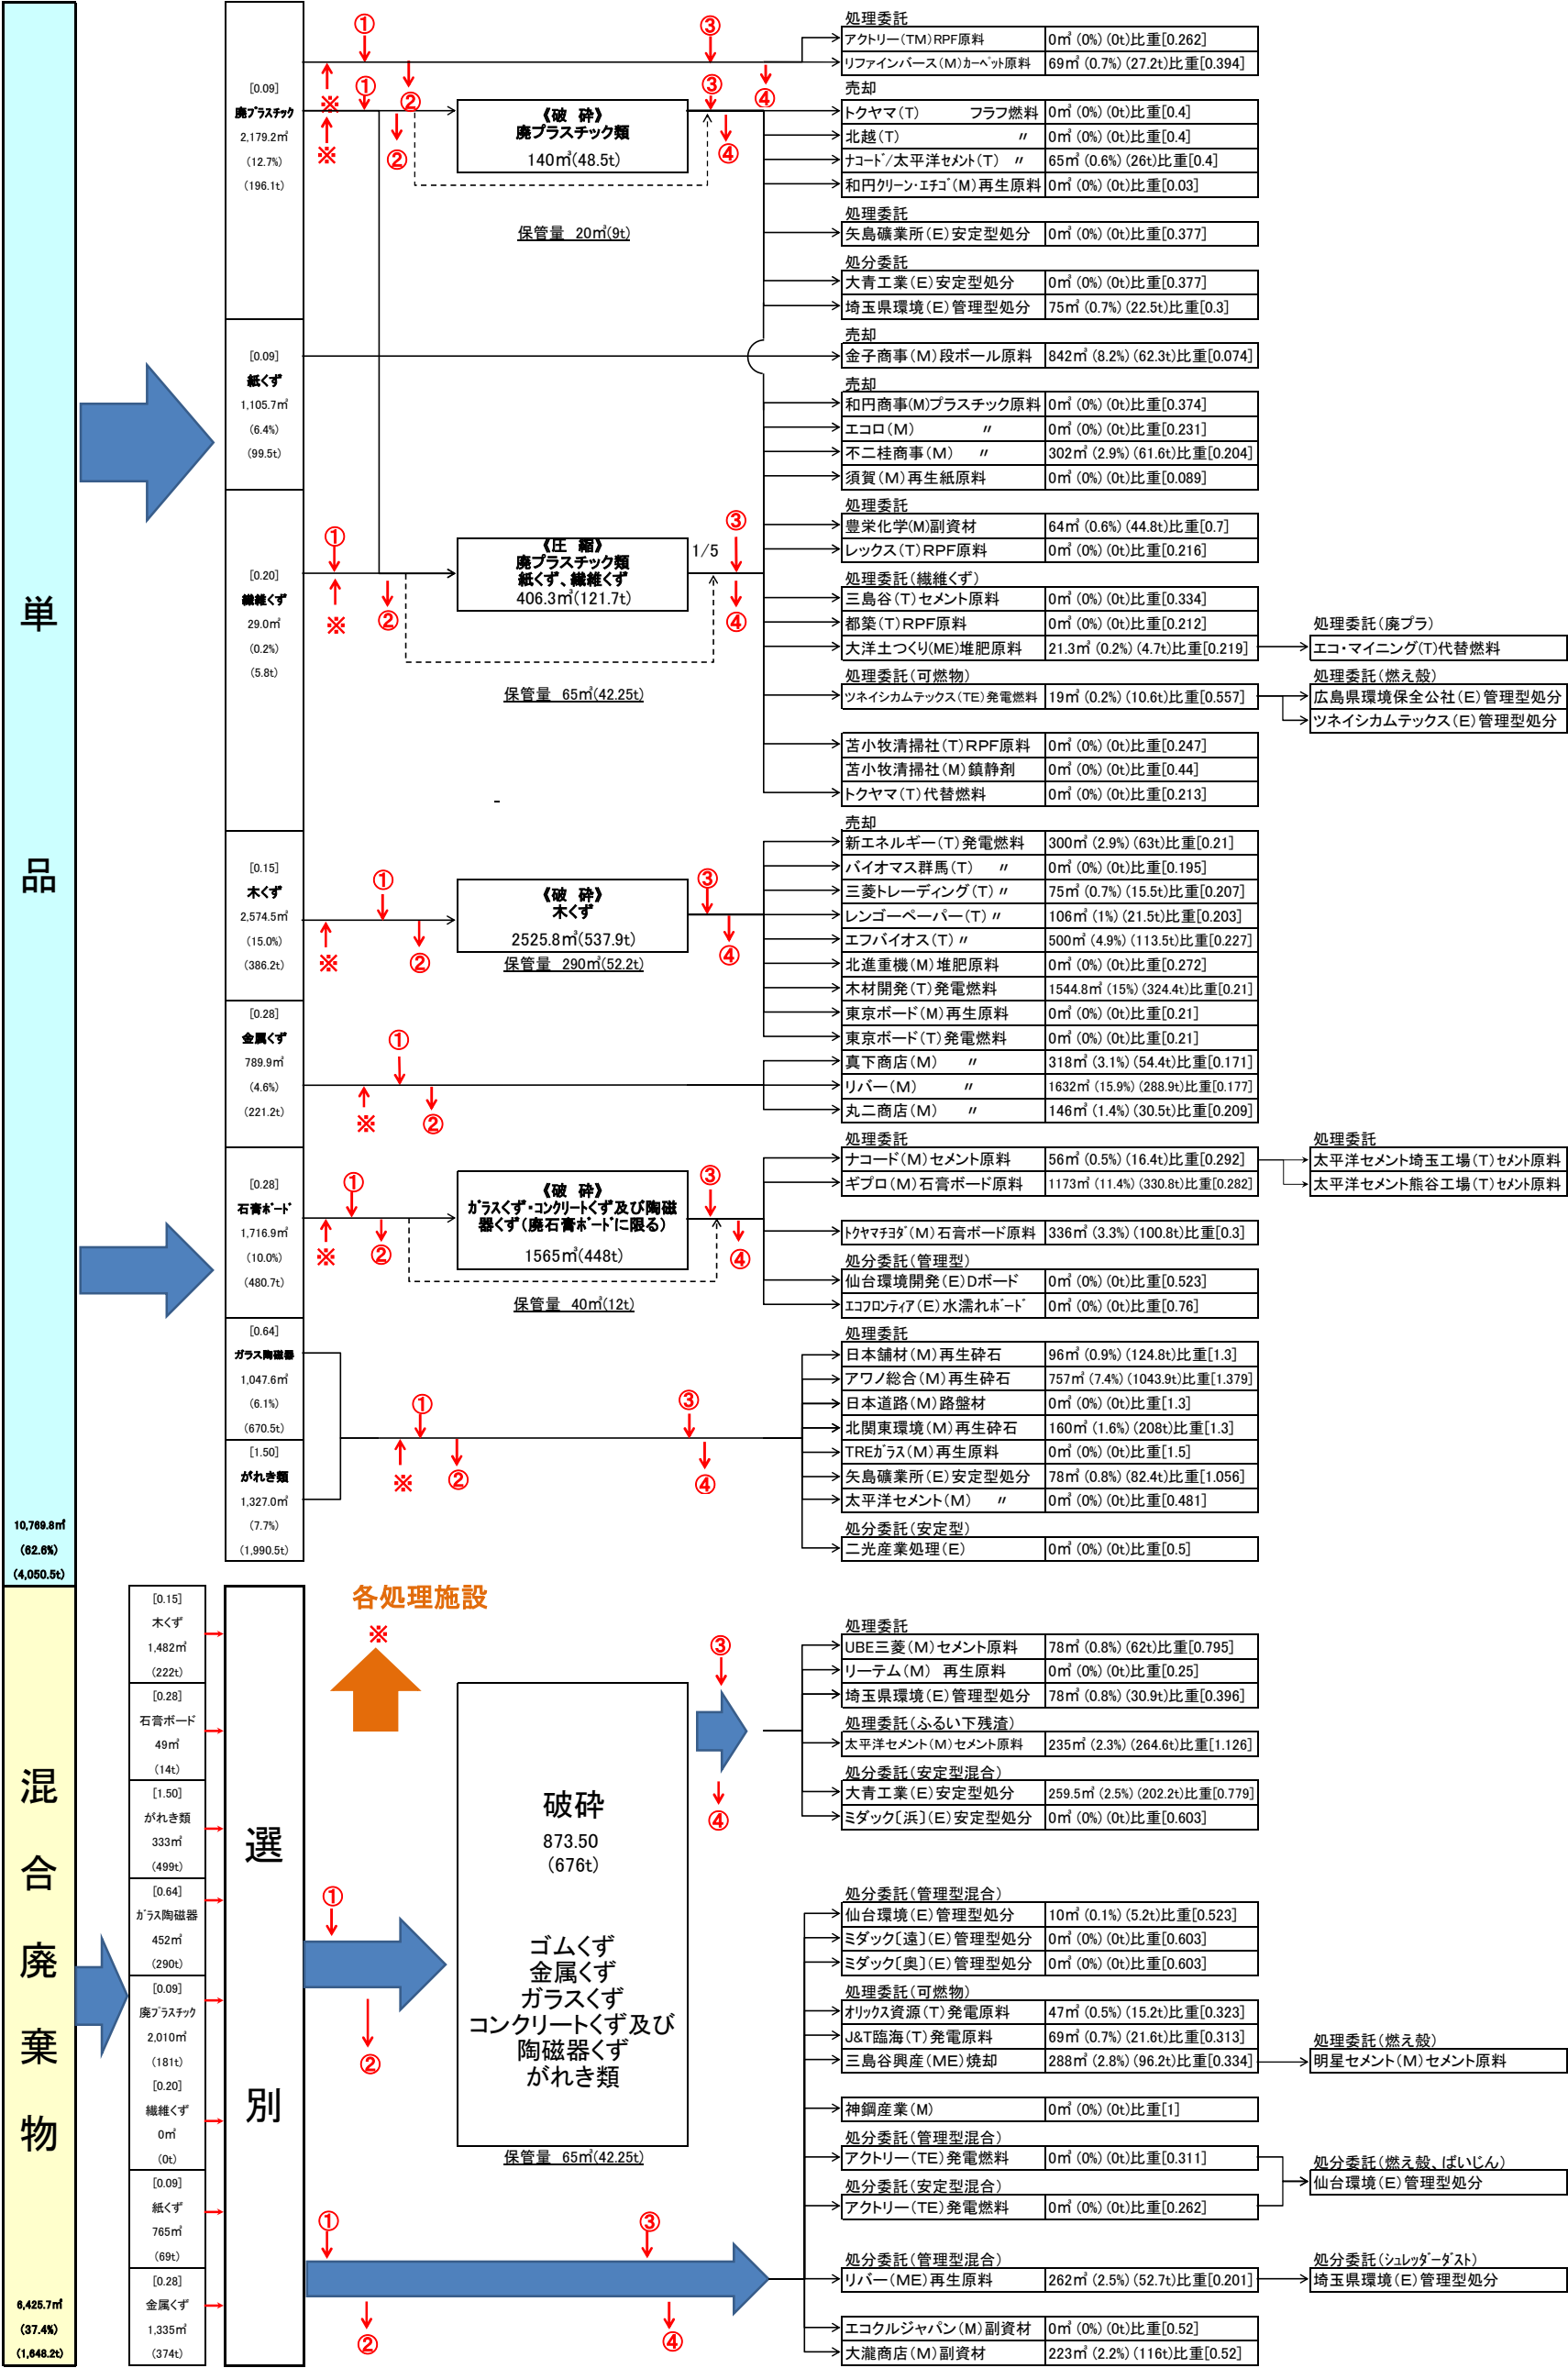

○比重 []
・搬入については建築系混合廃棄物の原単位調査報告書(平成24年)
・搬出については実比重を計測 (※がれき類のみ搬入値が実比重値計算)

○減容
・圧縮の減容率は1/5で算出

◎リサイクル率(減容を含む) 100-(エミッション量 ÷ 搬入量 × 100)

搬入量	保管量
17,195.48㎡ (5,698.6t)	①前月処理前保管量1,198㎡(527t) ②当月処理前保管量1,668㎡(734t) ③前月処理後保管量453㎡(199t) ④当月処理後保管量546㎡(240t)


リサイクル率
96.01 %

マテリアルリサイクル	6,874.9㎡ (2,953.7t)
サーマルリサイクル	2,723.9㎡ (610.2t)
エミッション	685.8㎡ (381.1t)

搬出量
10,284.60㎡ (3,945.0t)

処理前選別・保管ヤード 【8月度】

No.	ヤード	許可保管量	保管量	保管率
1	混合廃棄物	154.0 m ³	55.0 m ³	35.71 %
2	廃プラスチック	35.0 m ³	16.0 m ³	45.71 %
3	石膏ボード	280.0 m ³	40.0 m ³	14.29 %
4	がれき類	855.0 m ³	410.0 m ³	47.95 %
5	木くず	294.6 m ³	95.0 m ³	32.25 %

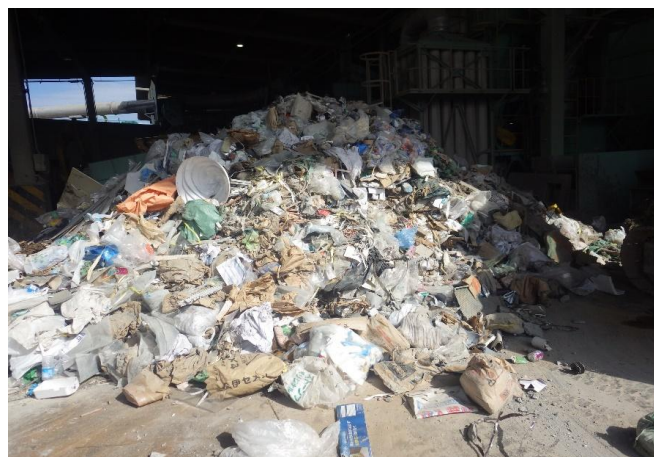


【1 混合廃棄物 選別ヤード】



【2 廃プラスチック 選別ヤード】



【3 石膏ボード 保管ヤード】

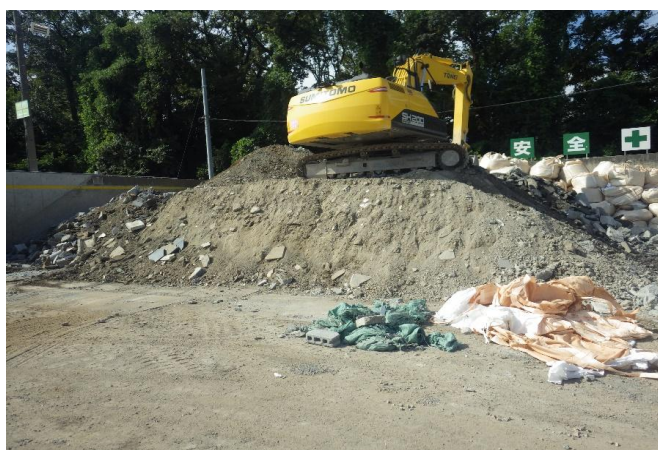

【4 がれき類 保管ヤード】



【5 木くず 保管ヤード】
