
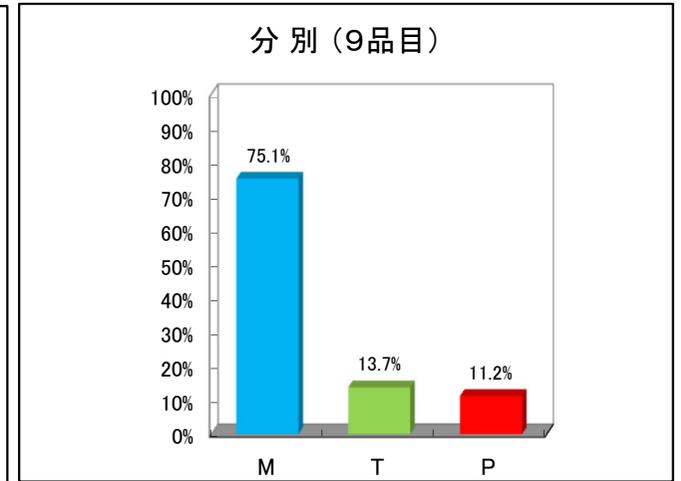


# ゼロエミッション計画書

【リサイクル先限定】

会社名	〇〇建設株式会社		
作業所名	練馬本社ビル新築工事		
所在地	東京都練馬区谷原1丁目		
工期	2024年04月01日 ~	2028年03月31日	48カ月
延床面積	22,000.00 m <sup>2</sup>	リデュース	m <sup>2</sup>
原単位	23.0 Kg/m <sup>2</sup>	リユース	m <sup>2</sup>
重量・容量	506 t	1,874 m <sup>3</sup>	リサイクル
距離	(往復) 56 km		
車両・容器	4 t コンテナ		
構造・用途	S造/教育施設		
階数	地上3階		

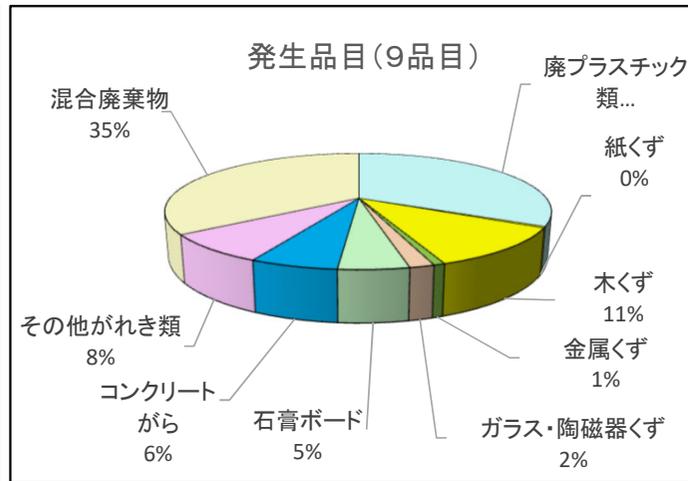

運搬費 8,433,000円 処分費 14,328,000円 合計 22,761,000円							仕様先			供給量			
品目コード	品目	車種	台数	容器	運搬費	数量	処分費	M	T	P	発電量	燃料	世帯数
0600	廃プラスチック類	8t	77	フレコン	2,749,500	611	5,193,500	大瀧商店、不二桂エコ	太平洋セメント				
0700	紙くず	8t	1	フレコン	31,500	7	35,000	金子商事、三島谷					
0800	木くず	8t	27	フレコン	945,000	210	630,000			新エネルギー供給網	107,012		357
1200	金属くず	8t	2	フレコン	63,000	14	7,000	リバー					
1300	ガラス・陶磁器くず	8t	4	フレコン	144,000	32	480,000	太平洋セメント					
1322	石膏ボード	8t	12	フレコン	400,500	89	623,000	トクヤマ、ギプロ					
1501	コンクリートがら	8t	14	フレコン	504,000	112	504,000	アワノ総合					
1500	その他がれき類	8t	19	フレコン	661,500	147	661,500	太平洋セメント					
2000 3600	混合廃棄物	8t	82	フレコン	2,934,000	652	6,194,000	大瀧商店					
合計			238		8,433,000	1,874	14,328,000				107,012		357

M:マテリアルリサイクル、T:サーマルリカバリー、P:パワージェネレーション 3R計画(排出事業者) 法的要求事項、M・T・P(東明興業)
